الإطار العملي

نموذج التنفيذ والتأسيس

وثيقة عمل للنقاش والتطوير

تنتقل الرؤية الوطنية إلى منظومة مؤسسية قائمة: مظلة جامعة، وثلاثة أذرع تنفيذية، وجهات خدمية مساندة، تعمل ضمن حوكمة رئاسية واضحة، وهياكل إدارية محددة، وآليات تنفيذ ورقابة قابلة للقياس بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الثقة المؤسسية.

المحتويات

01 من الرؤية إلى الكيان

02 البنية الهرمية والحوكمة

03 المظلة والأذرع الثلاثة

04 هيكل الشركة الواحدة

05 الحوكمة وضم الأجهزة

06 إدارة المستفيدين

07 التمويل

08 الإطار التعاقدي

09 مؤشرات الأداء

10 خريطة المسار

11 دورة تنفيذ المشروع

12 خطة الانطلاق

13 المخاطر والضوابط


01 · من الرؤية إلى الكيان

منظومة مترابطة، لا مجرد شركة

يتحول النموذج المعتمد إلى منظومة مؤسسية متكاملة، عمودها الفقري هو الكيان الناشئ بوصفه المظلة الجامعة.

ويوضح المخطط التالي ترابط المظلة بالأذرع التنفيذية والجهات المساندة، وكيف تتدفق الأرض من هيئة العقارات لتغذي الذراعين، ويعود من المسارين عائد إلى خزينة الدولة.

المخطط 1 · دائرة الترابط بين مكونات الكيان الناشئ

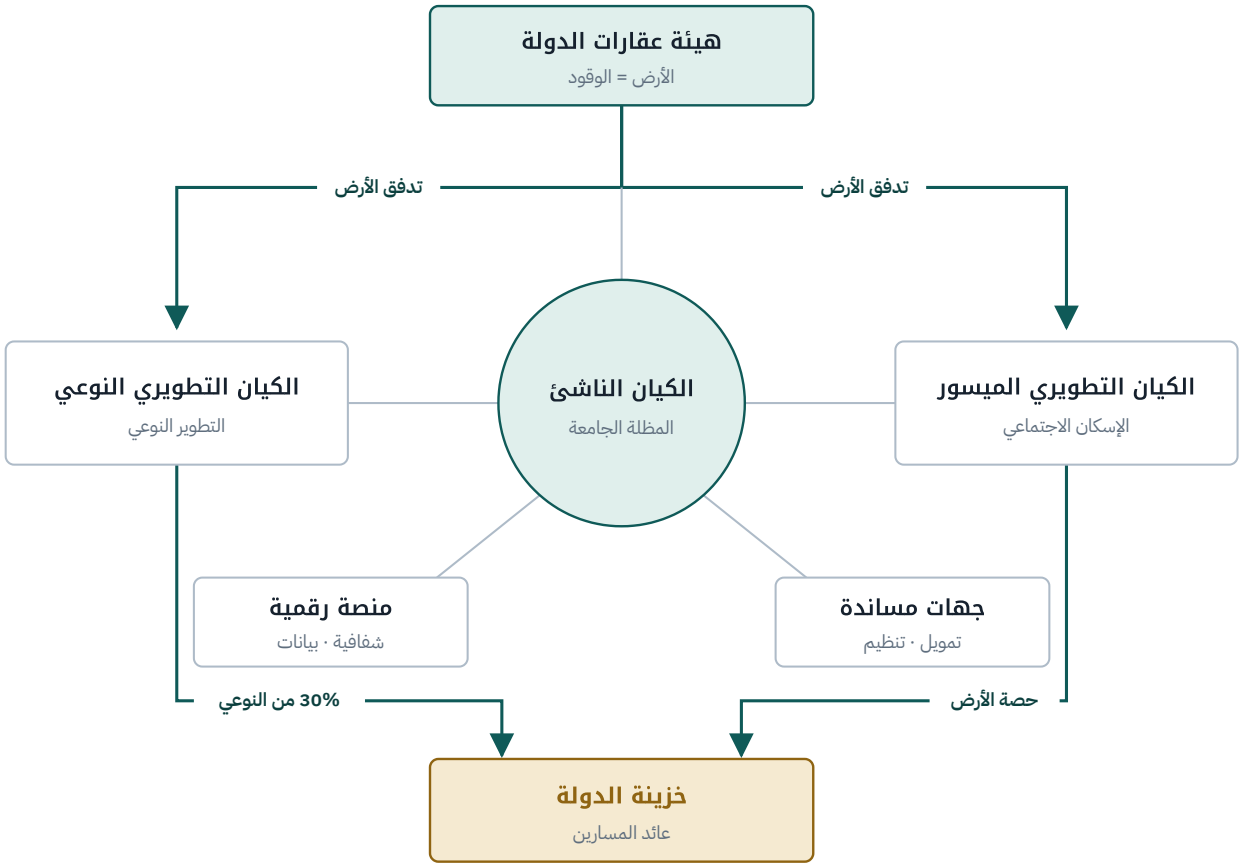


الأرض تتدفق من هيئة عقارات الدولة إلى الذراعين تحت مظلة الكيان الناشئ، ويعود من المسارين عائد إلى خزينة الدولة: حصة الأرض من الميسور، و30% من عائد النوعي.

منظومة تجمع بين سرعة التنفيذ وضمانة الحوكمة من القمة إلى القاعدة.

المنظومة من القمة إلى القاعدة في خريطة واحدة

تلخص هذه الخريطة بنية المنظومة وحوكمتها: من الرعاية الرئاسية العليا في القمة، إلى مجلس إدارة الكيان الناشئ الذي يجمع تحت مظلته الجهات الحكومية ونقابة المهندسين ولجنة مجلس الشعب، فالإدارة التنفيذية، وصولا إلى الأذرع التنفيذية المتوازية، مع خط مستقل للتدقيق يرفع تقاريره مباشرة إلى الرعاية الرئاسية العليا.

المخطط 2 · البنية الهرمية والحوكمة

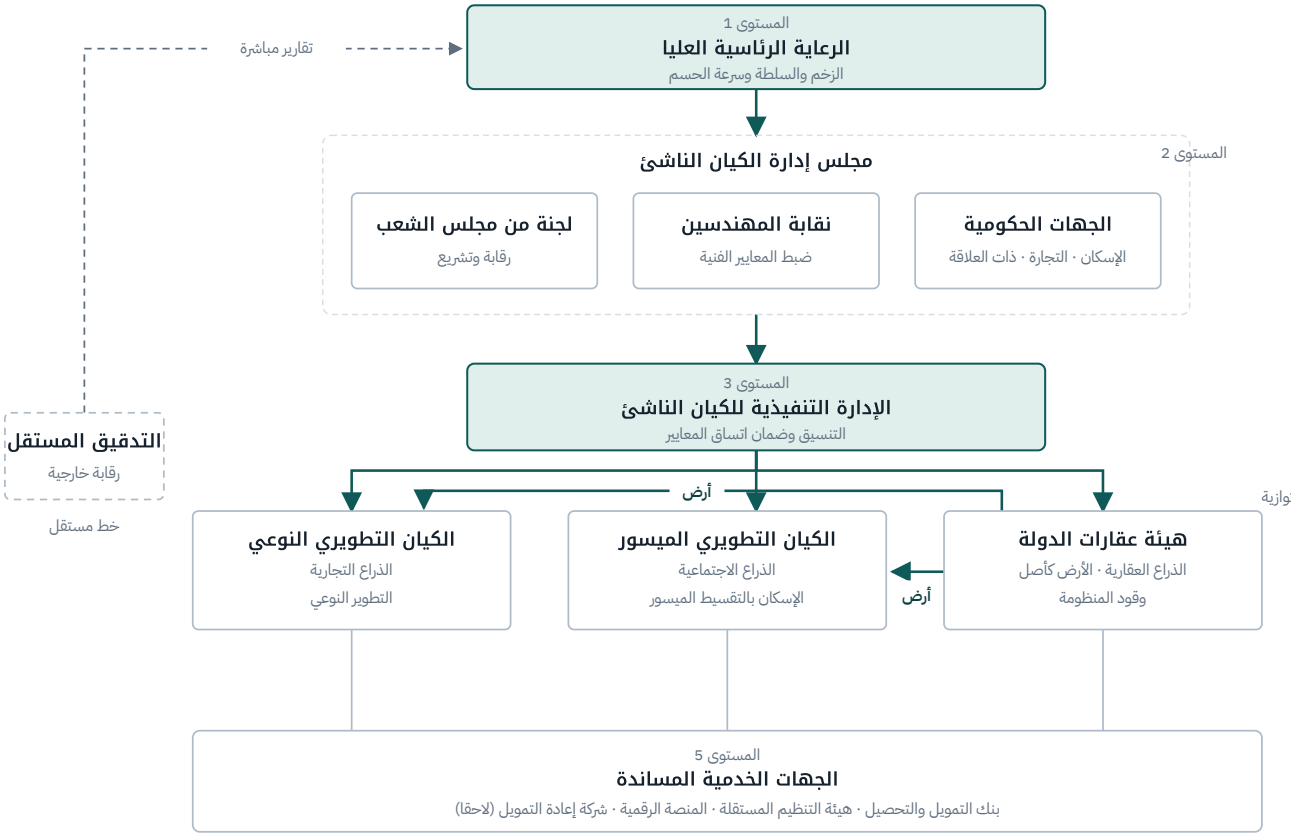

خمسة مستويات من الرعاية الرئاسية العليا إلى الجهات الخدمية المساندة. الأرض تنتقل من هيئة عقارات الدولة إلى الذراعين، والتدقيق المستقل يرفع تقاريره مباشرة إلى القمة خارج التسلسل التنفيذي.

03 · المظلة والأذرع الثلاثة

الأرض أولا، ثم توزيع بنسب وعائد للدولة

تنتظم المنظومة تحت مظلة واحدة تضع السياسة وتنسق، وثلاثة أذرع تنفيذية يفصل بينها توزيع واضح للأدوار. وتبدأ الدورة من أرض حكومية تتاح بسعر اقتصادي، فتوزع بنسب بين السكن الميسور والتطوير النوعي، ويعود من المسارين عائد إلى خزينة الدولة.

الذراع العقارية

هيئة عقارات الدولة

تجرد أملاك الدولة وترتب ملفاتها القانونية، ثم تضخ الأراضي المؤهلة كأصل عام للذراعين التنفيذيين دون بيعها نقدا. الأرض هي وقود المنظومة.

الذراع الاجتماعية

الكيان التطويري الميسور


تتسلم الأرض الاجتماعية، وتطرح المناقصات على المقاولين، وتشرف وتستلم، ثم تبيع الوحدة بدفعة ميسورة وأقساط طويلة، مع بقاء الملكية حتى السداد الكامل.

الذراع التجارية

الكيان التطويري النوعي

تطور مشاريع نوعية مولدة للربح عبر مطورين من القطاع الخاص، ويعود من عائدها 30% إلى خزينة الدولة، مع توجه مؤسسي للطرح العام لاحقا.

المخطط 3 · الأرض وتوزيعها وعوائد الخزينة

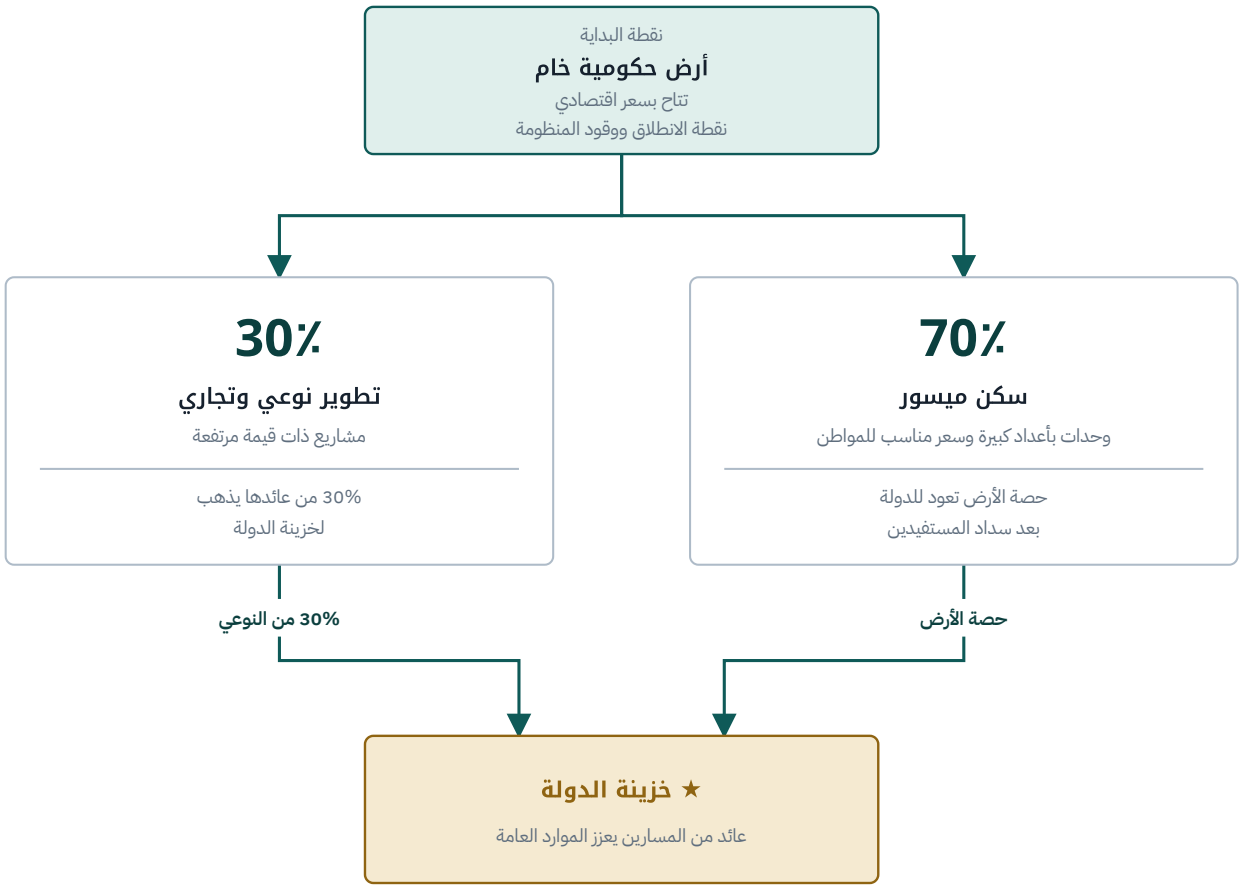

التدفق إلى الخزينة: حصة الأرض بعد سداد المستفيدين، و30% من النوعي إلى خزينة الدولة.

كل ذراع شركة مؤسسية كاملة

لا تدار الأذرع كإدارات بسيطة، بل كشركات مؤسسية مكتملة الهيكل، بما يضمن الكفاءة والمساءلة. ويصلح هذا الهيكل النموذجي لكل من «الكيان التطويري الميسور» و«الكيان التطويري النوعي» مع اختلاف التركيز.

الهيكل التنظيمي



الإدارة المالية	الإدارة القانونية
إدارة المشاريع	إدارة المستفيدين
إدارة العقود	التقنية والبيانات
الرقابة والجودة	العلاقات الحكومية
المخاطر والامتثال	التدقيق الداخلي

تركيز «الكيان التطويري الميسور»

إدارة المستفيدين، والتقسيط، والإشراف على التنفيذ الاجتماعي، وعدالة التخصيص.

تركيز «الكيان التطويري النوعي»

التطوير التجاري، وتقاسم الإيرادات مع المطورين، والتوجه نحو الطرح العام مستقبلا.

05 · الحوكمة وضم الأجهزة

سرعة في الإنجاز، وانضباط في النزاهة

يقوم نموذج الحوكمة على ضم الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت سقف واحد لاختصار الدورات، مقترنا بضمانات مؤسسية تصون النزاهة. فتختصر البيروقراطية بالسرعة، وتضبط المخاطر بالشفافية.

ضم مكاتب الأجهزة تحت سقف واحد

لكل جهة يمر بها المشروع مكتب ممثل داخل الشركة، يعالج معاملاتها فورا.

- البلدية والتراخيص
- التنظيم العمراني
- العدل والسجل العقاري
- التجارة
- المياه والصرف
- الكهرباء
- الاتصالات
- الجمارك
- العمل والموارد
- المالية
- البيئة والدفاع المدني

الضمانات المؤسسية

استقلال الولاء الوظيفي

كل موظف يتبع وزارته الأم لا الشركة، فلا تملك الشركة سلطة إخضاع قراراته.

الشفافية الصاعدة

ترفع تقارير دورية بكل قرار ومعاملة إلى أعلى سلطة، مما يمنع التضليل.

التدقيق المستقل على كل إدارة

مكاتب تدقيق خارجية تراقب كل إدارة: المستفيدين، التمويل، العقود، المشتريات، التدقيق الهندسي، المقاولات والدفعات، والمالية.

منصة مشتريات إلكترونية

طرح علني وشفاف يحقق المنافسة العادلة ويخفض السعر، عبر تجميع الكميات وأرشيف قابل للتدقيق.

---

06 · إدارة المستفيدين

رحلة واضحة من التسجيل حتى التملك

تدار علاقة المستفيد عبر منصة رقمية تضمن العدالة والشفافية، بمعايير أهلية معلنة تراعي طبيعة الدخل في السياق المحلي، وآلية فرز علنية عند تجاوز الطلب العرض.

مراحل الرحلة

1
التسجيل الرقمي
عبر المنصة الموحدة

2
دراسة الأهلية
وفق معايير معلنة

3
الفرز والترشيح
حسب الأولوية

4
التخصيص
تخصيص علني شفاف

5
التملك
بعد اكتمال السداد

نموذج ملف المستفيد إطار

- البيانات الأساسية والهوية الوطنية
- مستوى الدخل وطبيعته (منتظم / غير منتظم)
- حالة السكن الحالية ودرجة الأولوية
- تفضيلات الموقع ونوع الوحدة
- سجل الأهلية ونتيجة الفرز

مبادئ القبول والترشيح

- معايير معلنة ومتاحة للجميع مسبقا
- مراعاة الاقتصاد غير الرسمي والدخل غير المنتظم
- عدم إقصاء الشريحة المستهدفة فعليا
- فرز رقمي علني غير قابل للتلاعب
- آلية شكاوى واضحة ومتابعة

تمويل المشروع، لا المشتري

ينصب التركيز على تمويل كلفة البناء خلال سنوات التنفيذ، لا على دعم المستفيد. وتعرض خيارات التمويل دون ترجيح بينها، فالقرار سيادي، على أن تسهم عوائد التطوير النوعي في استدامة المنظومة وسد فجوة التمويل.

خيارات التمويل

تعرض دون ترجيح

الخيار الأول

سندات تجارية

أدوات دين تجارية (لا حكومية) تطرح على المستثمرين بعائد محدد وآجال واضحة، توفر سيولة للتنفيذ دون تحميل الخزينة.

الخيار الثاني

مساهمات استثمارية

دخول مستثمرين بحصص في المشاريع النوعية، يتقاسمون العائد والمخاطرة، فيتوسع رأس المال دون دين.

الخيار الثالث

تمويل بنكي

تسهيلات من المصارف بضمان المشروع وتدفقاته، تكمل الفجوة بين كلفة البناء وتحصيل الأقساط.

المخطط 4 · آلية التمويل والاسترداد



ثلاث مراحل متعاقبة: مصدر التمويل، ثم سد الفجوة من عوائد النوعي، ثم الاسترداد عبر التحصيل طويل الأجل.

خيار التمويل وذراع التطوير وجهان لمعادلة واحدة وربح التطوير النوعي هو ما يسند استدامة المنظومة.

الوعد بالتمليك، وعقود تحمي الأطراف

تباع الوحدة بنظام الوعد بالتمليك: دفعة أولى ميسورة وأقساط تمتد عشر سنوات، مع بقاء الملكية لدى «الكيان التطويري الميسور» حتى اكتمال السداد. وتتكامل ثلاثة أنواع من العقود تحمي المنظومة وكل أطرافها.

نموذج عقد الوحدة (الوعد بالتمليك) إطار

- الأطراف ووصف الوحدة والثمن المعتمد
- دفعة أولى ميسورة وأقساط تمتد عشر سنوات
- بقاء الملكية لدى «الكيان التطويري الميسور» حتى السداد الكامل
- شروط نقل الملكية عند اكتمال السداد
- آلية التعثر وإعادة الجدولة لمرة واحدة

مبادئ ضابطة للعقود

- وضوح تام في الالتزامات وآليات الدفع
- حد أدنى مضمون وضمانات بنكية في عقود التطوير
- ربط دفعات المقاول بنسب الإنجاز الفعلية
- حفظ سندات الملكية حتى اكتمال الالتزامات
- ضوابط تمنع الانحراف التجاري عن المهمة

أنواع العقود

نوع العقد	الأطراف	الجوهر
عقد المستفيد	«الكيان التطويري الميسور» ← المواطن	وعد بالتمليك دفعة أولى وأقساط تمتد عشر سنوات وملكية محفوظة حتى السداد.
عقد المقاول	«الكيان التطويري الميسور» ← المقاول	دفعات مرحلية تصرف بحسب نسب الإنجاز الفعلية، فلا ينتظر البيع.
عقد المطور	«الكيان التطويري النوعي» ← المطور	تقاسم إيرادات بحد أدنى مضمون وضمانات بنكية تحمي المنظومة.

لوحة مؤشرات المشروع، قابلة للقياس والنشر

تتحول متابعة المشروع إلى أرقام واضحة تنشر علنا، فتصبح الشفافية جزءا من بنيته. وتعرض على مستويين: لوحة شاملة لمتابعة الإنجاز، ولوحة مختصرة تلخص حالة المشروع.

اللوحة الشاملة · متابعة الإنجاز

تحدث وتنشر دوريا

الوحدة	المؤشر	الوصف
م٢	**الأمتار المطورة**	إجمالي المساحات قيد التطوير
عدد	**عدد الوحدات**	الوحدات المخططة في المشروع
٪	**نسبة الإنجاز**	تقدم التنفيذ مقابل الخطة
٪	**نسبة التسليم**	المسلم مقابل المنجز
عدد	**الوحدات المسلمة**	التراكمي حتى تاريخه

اللوحة المختصرة · حالة المشروع

ملخص سريع

الوحدة	المؤشر	الوصف
عدد	**عدد الوحدات**	إجمالي وحدات المشروع
م٢	**عدد الأمتار**	المساحة الإجمالية
عدد	**عدد المستفيدين**	من خصصت لهم وحدات
عدد	**عدد المسجلين**	إجمالي طلبات التسجيل

10 · خريطة المسار

أين نحن، وأين نريد أن نصل

يتدرج المسار الوطني عبر ثلاث مراحل، من نقطة الانطلاق الحالية إلى الغاية الوطنية. تابع الخريطة بالتمرير لترى تقدم المسار مرحلة مرحلة.

المرحلة الحالية · أين نحن الآن

نقطة الانطلاق

1 · المرحلة الأولى

إثبات النموذج

مشروع تأسيسي على أرض وطنية واضحة الملكية، يثبت الجدوى ويبني الثقة بالإنجاز.

٣٠٠٠–٥٠٠٠ وحدة | تفويض وموقع واضح

2 · المرحلة الثانية

التوسع

تفعيل المحرك المزدوج في عدة محافظات، وتدوير الإيراد لتمويل النمو المتدرج.

عدة محافظات | إصلاح الأراضي والتمويل

3 · المرحلة الثالثة

التحول

الانتقال إلى منظومة متكاملة: مدن متكاملة وتشريع شامل واستدامة ممتدة عبر العقود.

مدن متكاملة | استمرارية السياسات

الغاية الوطنية · أين نريد أن نصل

برنامج وطني رائد

دورة المشروع الواحد، من الاعتماد إلى التكرار

لكل مشروع دورة تنفيذ واضحة لها بداية ونهاية، تبدأ باعتماد النموذج وتنتهي بإطلاق المشروع، ثم تتكرر الدورة ذاتها في المشروع التالي. وبهذا التكرار المنضبط يتوسع البرنامج مشروعا بعد مشروع.

#	الخطوة	الوصف
1	**اعتماد النموذج**	إقرار النموذج كإطار عمل
2	**اعتماد الإطار**	تثبيت الإطار المؤسسي
3	**تأطير العمل**	تحديد النطاق والمسؤوليات
4	**اعتماد الموقع**	اختيار الأرض وتأهيلها
5	**التمويل**	تأمين مصادر التمويل
6	**التصاميم**	إعداد التصاميم الهندسية
7	**نموذج أولي**	تنفيذ Mock-up للتحقق
8	**التسويق والمبيعات**	طرح الوحدات وتسجيل المستفيدين
9	**إطلاق المشروع**	البدء الفعلي بالتنفيذ
↻	**تكرار الدورة**	الانتقال للمشروع التالي

دورة متكررة · تنتهي الدورة بإطلاق المشروع، ثم تبدأ من جديد في المشروع التالي

خطة عمل تنفيذية خلال ثلاثة أشهر

تنطلق المرحلة التأسيسية بخطة زمنية محددة، تنتقل من تأسيس الكيان وربط الجهات، إلى تثبيت النموذج وآليته، فالبدء الفعلي بأول مشروع.

١ · الشهر الأول

التأسيس والربط

- تأسيس الشركة وإطارها القانوني
- ربط الجهات الحكومية ذات العلاقة
- التعريف بالنموذج وتأطيره مؤسسيا

٢ · الشهر الثاني

تثبيت النموذج

- تثبيت النموذج وآلية عمله
- مواءمة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة
- إعداد دراسة الجدوى والمسح القانوني للأرض

٣ · الشهر الثالث

الانطلاق الفعلي

- البدء الهندسي للمشروع الأول
- إطلاق التصاميم وطرح المناقصات
- تشغيل المنصة الرقمية للمستفيدين

المخاطر والضوابط

يقوم النموذج على مصارحة واضحة بالمخاطر وضوابطها، باعتبار ذلك جزءا من جدية الطرح ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. ولكل خطر ضابط وقائي محدد.

الخطر	الضابط
نزاع الملكية يوقف مشروعا	البدء بأرض نظيفة + آلية نزاعات
التضخم يؤثر في قيمة الأقساط	ربط جزئي بالتضخم مع سقف حماية
تعثر المطور أثناء البناء	اشتراطات مالية + ضمانات بنكية
مواقع بعيدة عن الخدمات	ربط المشروع بالخدمات قبل الاعتماد
ضعف الثقة في التوزيع	فرز رقمي علني + هيئة مستقلة
تعثر المستفيد في السداد	صندوق احتياطي لإعادة جدولة واحدة

المنظومة مصممة بالكامل ومحكومة في هياكلها وحوكمتها، والمرحلة التأسيسية محددة ومنخفضة المخاطر. والقرار المطلوب هو الإذن بإطلاق هذه المرحلة، لتتحول الرؤية الوطنية إلى إنجاز ملموس قابل للقياس والتوسع.

الإطار العملي · الكيان الناشئ

نموذج التنفيذ والتأسيس لقطاع الإسكان

الحالة	وثيقة عمل للنقاش والتطوير
المخططات	أربعة مخططات مرقّمة
الأقسام	ثلاثة عشر قسمًا

وثيقة داخلية للعرض والنقاش والتطوير
